



## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REFORMA DA FACHADA DOS FUNDOS - TEATRO SERGIO CARDOSO

BOLETINS UTILIZADOS: CDHU - SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE : OUT 23 / SINAP - NÃO DESONERADPO - 20.06

| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR TOTAL   |               |              |              |              |              |              |  |
|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|      |  |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |  |
| 1    | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM  | R\$ 32.878,34 | R\$ 32.878,34 |              |              |              |              |              |  |
|      |  |               | 100%          |              |              |              |              |              |  |
|      |  |               |               |              |              |              |              |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR TOTAL   | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |  |
| 2    | LOCAÇÃO DE DUTO COLETOR DE ENTULHO   | R\$ 37.220,40 | R\$ 7.444,08  | R\$ 5.955,26 | R\$ 5.955,26 | R\$ 5.955,26 | R\$ 5.955,26 | R\$ 5.955,26 |  |
|      |  |               | 20%           | 16%          | 16%          | 16%          | 16%          | 16%          |  |
|      |  |               |               |              |              |              |              |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR TOTAL   | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |  |
| 3    | LOCAÇÃO DE QUADROS METALICOS PARA PLATAFORMA DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO | R\$ 7.371,84  | R\$ 7.371,84  |              |              |              |              |              |  |
|      |  |               | 100%          |              |              |              |              |              |  |
|      |  |               |               |              |              |              |              |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR TOTAL   | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |  |
| 4    | BALANCIM ELETRICO TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL, COM ALTURA ATÉ 60 M    | R\$ 25.638,84 | R\$ 5.127,77  | R\$ 4.102,21 | R\$ 4.102,21 | R\$ 4.102,21 | R\$ 4.102,21 | R\$ 4.102,21 |  |
|      |  |               | 20%           | 16%          | 16%          | 16%          | 16%          | 16%          |  |
|      |  |               |               |              |              |              |              |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR TOTAL   | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |  |
|      |  |               | R\$ 1.482,00  | R\$ 1.185,60 | R\$ 1.185,60 | R\$ 1.185,60 | R\$ 1.185,60 | R\$ 1.185,60 |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   |               |              |              |              |              |              |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |   |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 5    | ALUGUEL DE GUINCHO MENSAL - COM TODOS OS ITENS NECESSARIOS E TRANSPORTE | R\$ 7.410,00  | 20%           | 16%          | 16%          | 16%          | 16%          | 16%          |
|      |   |               |               |              |              |              |              |              |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   |               |              |              |              |              |              |
|      |   |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 6    | PONTOS DE ANCORAGEM COM DOCUMENTAÇÃO E TESTES INCLUSO                   | R\$ 25.900,00 | R\$ 25.900,00 |              |              |              |              |              |
|      |   |               | 100%          |              |              |              |              |              |
|      |   |               |               |              |              |              |              |              |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   |               |              |              |              |              |              |
|      |   |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 7    | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | R\$ 27.326,22 | R\$ 5.465,24  | R\$ 4.372,20 | R\$ 4.372,20 | R\$ 4.372,20 | R\$ 4.372,20 | R\$ 4.372,20 |
|      |   |               | 20%           | 16%          | 16%          | 16%          | 16%          | 16%          |
|      |   |               |               |              |              |              |              |              |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   |               |              |              |              |              |              |
|      |   |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 8    | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL, E MATERIAL QUALQUER , EXCETO BARRO       | R\$ 2.344,32  | R\$ 2.344,32  |              |              |              |              |              |
|      |   |               | 100%          |              |              |              |              |              |
|      |   |               |               |              |              |              |              |              |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   |               |              |              |              |              |              |
|      |   |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 9    | RETIRADA DE CUMEEIRA , ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER                  | R\$ 101,80    | R\$ 101,80    |              |              |              |              |              |
|      |   |               | 100%          |              |              |              |              |              |
|      |   |               |               |              |              |              |              |              |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   |               |              |              |              |              |              |
|      |   |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 10   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO             | R\$ 7.930,78  | R\$ 4.758,47  | R\$ 3.172,31 |              |              |              |              |
|      |   |               | 60%           | 40%          |              |              |              |              |
|      |   |               |               |              |              |              |              |              |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   |               |              |              |              |              |              |
|      |   |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |

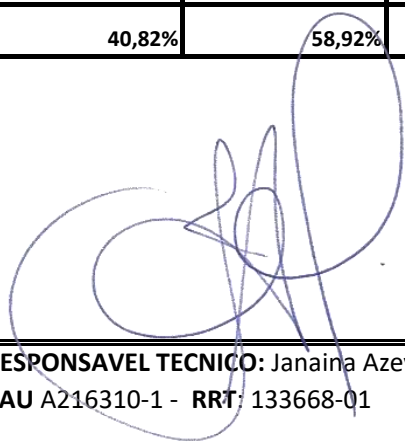
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL  |              |              |   |   |   |              |  |
|------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|---|--------------|--|
|      |   |              | 1            | 2            | 3 | 4 | 5 | 6            |  |
| 11   | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO         | R\$ 370,00   | R\$ 370,00   |              |   |   |   |              |  |
|      |   |              | 100%         |              |   |   |   |              |  |
|      |   |              |              |              |   |   |   |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL  | 1            | 2            | 3 | 4 | 5 | 6            |  |
| 12   | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM PRODUTOS QUÍMICOS | R\$ 635,20   |              | R\$ 635,20   |   |   |   |              |  |
|      |   |              |              | 100%         |   |   |   |              |  |
|      |   |              |              |              |   |   |   |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL  | 1            | 2            | 3 | 4 | 5 | 6            |  |
| 13   | REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES DE PARA RAIO                                 | R\$ 2.102,40 | R\$ 2.102,40 |              |   |   |   |              |  |
|      |   |              | 100%         |              |   |   |   |              |  |
|      |   |              |              |              |   |   |   |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL  | 1            | 2            | 3 | 4 | 5 | 6            |  |
| 14   | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4 X 1/4, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO   | R\$ 4.921,20 |              |              |   |   |   | R\$ 4.921,20 |  |
|      |   |              |              |              |   |   |   | 100%         |  |
|      |   |              |              |              |   |   |   |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL  | 1            | 2            | 3 | 4 | 5 | 6            |  |
| 15   | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO  | R\$ 345,60   |              | R\$ 345,60   |   |   |   |              |  |
|      |   |              |              | 100%         |   |   |   |              |  |
|      |   |              |              |              |   |   |   |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL  | 1            | 2            | 3 | 4 | 5 | 6            |  |
| 16   | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO  | R\$ 8.982,16 |              | R\$ 8.982,16 |   |   |   |              |  |
|      |   |              |              | 100%         |   |   |   |              |  |
|      |   |              |              |              |   |   |   |              |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL  | 1            | 2            | 3 | 4 | 5 | 6            |  |



| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   |              |              |               |               |               |               |  |
|------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|      |   |               | 1            | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |  |
| 23   | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m                                  | R\$ 6.869,66  | R\$ 686,97   | R\$ 6.182,70 |               |               |               |               |  |
|      |   |               | 10%          | 90%          |               |               |               |               |  |
|      |   |               |              |              |               |               |               |               |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   | 1            | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |  |
| 24   | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLIMEROS ACRILICOS , NA COR BRANCA                   | R\$ 71.766,42 |              |              | R\$ 35.883,21 | R\$ 35.883,21 |               |               |  |
|      |   |               |              |              | 50%           | 50%           |               |               |  |
|      |   |               |              |              |               |               |               |               |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   | 1            | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |  |
| 25   | HIDRO REPELENTE INCOLOR PARA FACHADA A BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOM'PERICO DISPERSO EM AGUA | R\$ 32.618,74 |              |              |               |               |               | R\$ 32.618,74 |  |
|      |   |               |              |              |               |               |               | 100%          |  |
|      |   |               |              |              |               |               |               |               |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   | 1            | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |  |
| 26   | ESMALTE A BASE DE AGUA, SOBRE SUPERFICIE METALICA - INCLUSIVE PREPARO                         | R\$ 1.907,20  |              |              |               | R\$ 1.907,20  |               |               |  |
|      |   |               |              |              |               | 100%          |               |               |  |
|      |   |               |              |              |               |               |               |               |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   | 1            | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |  |
| 27   | TEXTURA ACRILICA PARA USO EXTERNO - INCLUSIVE PREPARO   | R\$ 58.630,66 |              |              |               | R\$ 11.726,13 | R\$ 41.041,46 | R\$ 5.863,07  |  |
|      |   |               |              |              |               | 20%           | 70%           | 10%           |  |
|      |   |               |              |              |               |               |               |               |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL   | 1            | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |  |
| 28   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | R\$ 13.451,54 | R\$ 2.690,31 | R\$ 1.345,15 | R\$ 2.690,31  | R\$ 1.345,15  | R\$ 2.690,31  | R\$ 2.690,31  |  |
|      |   |               | 20%          | 10%          | 20%           | 10%           | 20%           | 20%           |  |



| ITEM | DESCRIÇÃO                        | VALOR TOTAL       |                |                |                |                |                |                |
|------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                  |                   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|      | <b>Total Final (R\$)</b>         | <b>600.107,11</b> | 139.293,44     | 116.881,10     | 110.753,33     | 81.736,09      | 74.606,17      | 76.836,98      |
|      | <b>BDI 24,91%</b>                | <b>149.486,68</b> | 24.914,45      | 24.914,45      | 24.914,45      | 24.914,45      | 24.914,45      | 24.914,45      |
|      | <b>Total Final com BDI (R\$)</b> | <b>749.593,79</b> | 164.207,88     | 141.795,55     | 135.667,78     | 106.650,54     | 99.520,61      | 101.751,42     |
|      | <b>% Parcela</b>                 |                   | 21,91%         | 40,82%         | 58,92%         | 73,15%         | 86,43%         | 100,00%        |
|      | <b>Acumulado (R\$)</b>           |                   | R\$ 164.207,88 | R\$ 306.003,43 | R\$ 441.671,21 | R\$ 548.321,75 | R\$ 647.842,36 | R\$ 749.593,79 |
|      | <b>% Acumulado</b>               |                   | 21,91%         | 40,82%         | 58,92%         | 73,15%         | 86,43%         | 100,00%        |

  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Janaina Azevedo Miguel  
**CAU A216310-1 - RRT: 133668-01**
